



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	19,7°C	0,0 mm/h	3,5 m/s	216°	76%
12:00	Polojasno	22,5°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	248°	59%
18:00	Déšť	16,0°C	0,4 mm/h	2,0 m/s	287°	88%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	8	8
						Lokus wolffkran	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 2.PP, 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 2.PP, 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Bourání stěn v 1.PP, 2.PP - Odvoz stavebního materiálu - Vytahování betonových bloků 2.PP, 3.PP	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž technologií 2.PP - Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Příprava zařízení staveniště - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Provádění pilot: 31c, 37a - Přípravné práce pro vrtání pilot	Hinton a.s		
- Stavba věžového jeřábu - Návoz věžového jeřábu	Lokus wolffkran		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Slovák Daniel (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	JE Group s.r.o.
-------	---------------------	------------------	-----------------

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 2.9.2026:

Žádám GD o zdokumentování bouraných konstrukcí tak, aby se rozsah prací dal zkontrolovat a vyhodnotit

PŘÍLOHY

AUTOR

Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

Požaduji důsledné provádění podstojkování bouraných otvorů dle statické části, viz příloha.


Ve 2.PP na ose 7 D a E' byla odstraněna část nosné stěny a u otvoru na ose 7E' bylo zbouráno i ostění a část stropu není podepřena, viz foto. Žádám o doplnění aspoň 2 stojek únosnosti 20 kN v prostoru rohu stropu, který není podepírán. Pokud dojde k vybourání i části nosné stěny, nutné provádět podstojkování ihned. Žádám o provedení obratem

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...09-09.pdf

KCP - Stavební den...09-09.pdf

FOT1.jpg

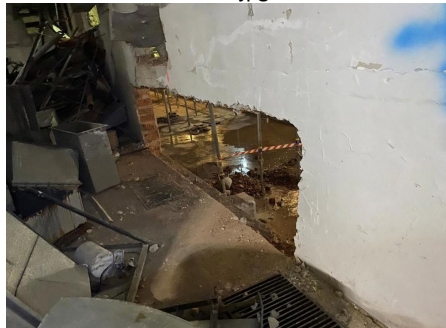

FOT2.jpg



FOT3.jpg



AUTOR

Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.


Bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot (dosud vyrobených armokošů):

Koš A1 3x, A2 2x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Koše P1 zatím nebyly vyrobeny. Před vlastním osazením do piloty je nutné vždy upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...09-09.pdf

Pil1.jpg

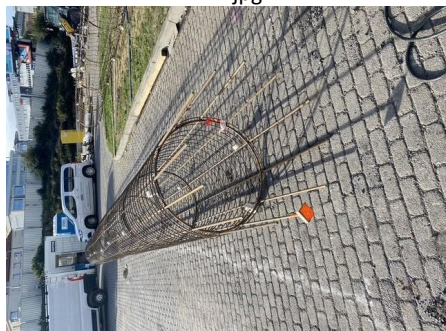

Pil2.jpg



Pil3.jpg



Pil4.jpg



AUTOR

Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.


Žádám GD, aby prováděl bourací práce betonových konstrukcí v souladu s TP pro bourací práce.


Ve 2.PP mezi osami 7 a F-G' bylo provedeno vybourání betonových dílců větší hmotnosti než 400 kg, při bourání nebylo na dopadišti zřízena plocha z 2 vrstev pneumatik. Doplňte stojky s únosností 20 kN á 1,0 m. Žádám okamžitě o sjednání nápravy

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...09-09.pdf

FOT4.jpg



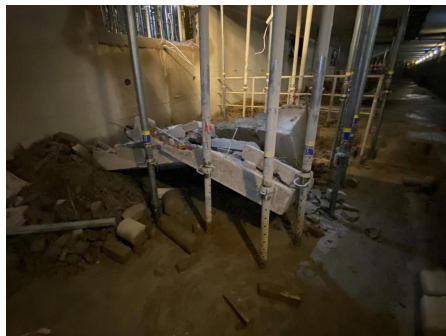

AUTOR

Římal Aleš (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

GEMO a.s.

Dnes 9.9 byla provedena kontrola za účasti TDI stojkování komunikační trasy a parkovacích stání dle přiložené přílohy. Bylo zkontrolován rozsah včetně hustoty stojkování v 1.PP, 2.PP, 3.PP. Dále bylo zkontrolováno davové oplocení, kde vrtná souprava má možnost pohybu v 1.NP. Bylo povoleno k pokračování na hlubinném založení.

PŘÍLOHY



KCP předání
plochy....2026.pdf



KCP - Stavební den...09-
09.pdf

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.15
10:55:51
+02'00'
