



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	11,9°C	0,0 mm/h	2,3 m/s	188°	88%
12:00	Polojasno	21,8°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	269°	55%
18:00	Polojasno	23,2°C	0,0 mm/h	3,1 m/s	270°	44%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 2.PP a 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Vytahování betonových bloků 3.PP - Řezání stěny v 1.PP a 2.PP - Vývoz betonových bloků	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž technologií 1.PP - Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Obetonování panelů pro VJ v 2.PP - Přípravné práce pro vrtnou plošinu - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Provádění pilot: 27,24 - Přípravné práce pro vrtání pilot	Hinton a.s		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.
Dnešního dne proběhla kontrola se zástupci TDI stojkování trámu dle pokynu statika č.3 v osách J/3. Bylo povoleno řezání 2/2 části desky.

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...09-02.pdf

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.
Při řezání základové desky byla zjištěna větší mocnost betonové základové desky než je dle PD. Mocnost např. základové desky v osách J/3 je


1100mm. GD upozorňuje, že tato situace se opakuje u více děr v základových kcí. Z toho důvodu je nutná změna pracovního postupu a ŽB kci odvrátat po celém obvodu.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...09-02.pdf

20260902_132558.jpg

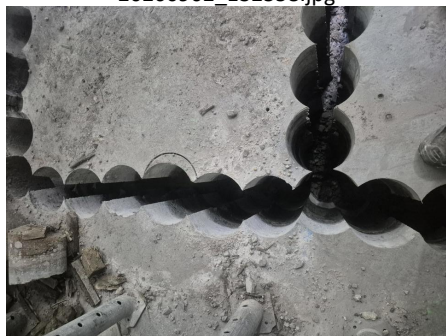

20260902_132552.jpg



20260902_132610.jpg



AUTOR

Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 2.9.2026:


Potvrzují kontrolu provedení podstojkování konstrukce trámů v ose J/3, možno provádět řezání 2/2 části desky

PŘÍLOHY




KCP - Stavební den...09-02.pdf

Fot1 2026 09 02.jpg

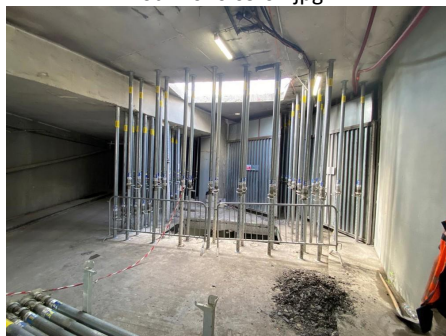

Fot2 2026 09 02.jpg

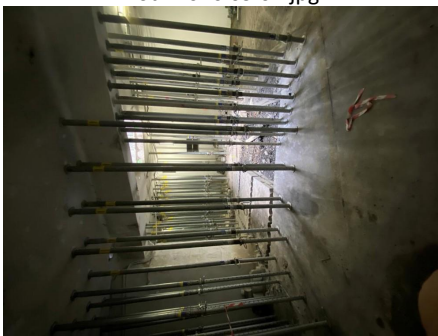

AUTOR

Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 31.8.2026:

Za TDS byla provedena kontrola statických a stavebních úprav pro osazení stav. jeřábů VJ1 a VJ2 dle pokynu statika č.1 s těmito výhradami:

1) Protože panely ve 2.PP byly podloženy šterkovou vrstvou, bude dle doporučení statika GD provedeno dobetonování obvodu panelů obou stav. jeřábů, statik GD toto doplní do pokynu č.1

2) GD doplní do tech. postupu (pro montáž jeřábu nebo pokynu č.1) četnost pravidelných kontrol statických opatření pod stav. jeřáby

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...09-02.pdf

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.08
13:37:13
+02'00'
