



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	8,9°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	193°	91%
12:00	Polojasno	18,5°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	37°	50%
18:00	Zamračeno	20,5°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	62°	42%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Bourání cihelné stěny naftové hospodářství pod Velínem - Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika - Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Provádění stojkování otvorů ve 1.PP-3.PP - Demontáž TZB parking 2PP, 1PP - Úklid staveniště - Kontrola trasy pro pojezd vrtné plošiny 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Příprava pro vrtání pilot 33a, 34a - Svařování Armokošů - Provádění piloty 33a	Hinton a.s		

DALŠÍ ZÁZNAMY:


AUTOR	Slovák Daniel (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	JE Group s.r.o.
-------	---------------------	------------------	-----------------

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 19.8.2026:

Dne 24.08. bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot:

Koš A1 2x, A2 1x, C1 1x, C2 1x a P1 5x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Před vlastním osazením do piloty je nutné upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C.

PŘÍLOHY






IMG_0329.jpg

IMG_0330.jpg

IMG_0331.jpg



IMG_0334.jpg

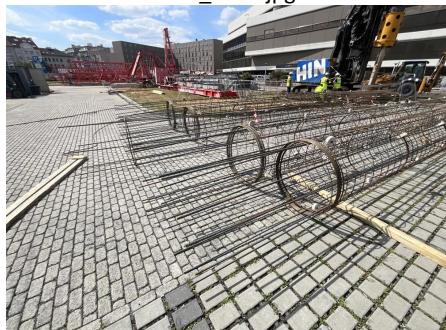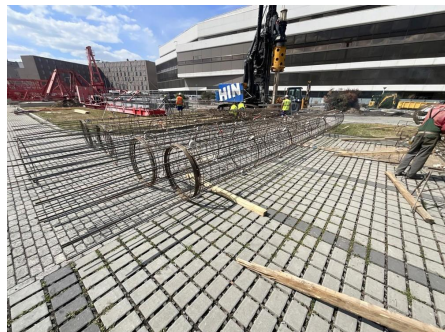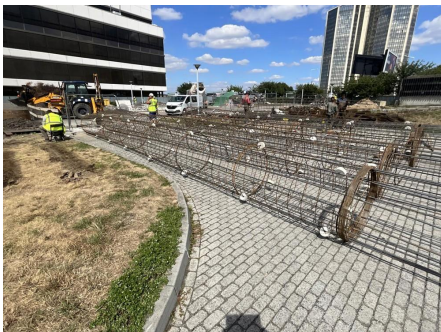

AUTOR

Matějček Jiří (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

(pátek) od 18:00 hod. došlo v prostoru Vyšehradu / staveniště ke srážkové události o intenzitě odpovídající dešti s dobou opakování $N = 5$ let. Ochranná opatření zhotovená zhotovitelem proti vnikání srážkové vody do stávajícího objektu KCP se ukázala jako nedostatečná a koncepčně chybná. Došlo ke dvěma samostatným poruchám:

a) Vybourané otvory ve stropní desce nad 2. PP (Jižní garáže) Srážková voda natékala vybouranými otvory ve stropní desce přímo do trasy ve 2. PP k trafokomorám VN. Dešťové svody Jižních garáží byly ve stávajícím stavu kapacitně dostatečné; příčinou zatečení nebyla kapacita svodů, nýbrž nezajištěné otvory ve stropní desce.

b) Provizorní ochranné hrazení na desce nad DUN (dešťová usazovací nádrž) Voda zadržaná v provizorním ochranném hrazení přesáhla výšky hrazení a přetekla. Z ochranného hrazení není zajištěno žádné čerpání ani odvodnění, opatření tedy nemá odtok a k přetečení musí dojít u každé srážky přesahující jeho retenční objem. Nejde o selhání provozu, nýbrž o vadu návrhu opatření.

Na staveništi nebyl v době události přítomen odpovědný zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí ani jím pověřená osoba). Zásah k odvrácení vniknutí vody do rozvodny/trafokomor VN a do technologických místností DUN provedla jednotka hasičského záchranného sboru podniku (HZSP) Kongresového centra Praha.

Na nedostatečnost ochrany proti zatékání z desky Jižních garáží byli zástupci zhotovitele — p. Chytil, p. Římal, p. Krobaurer — technickým dozorem stavebníka upozorněni opakovaně, s předstihem několika týdnů. Riziko zatékání z prostoru Jižních garáží do prostor VN je známé a historicky doložené; z tohoto důvodu je plánováno navýšení kapacity dešťových svodů Jižních garáží. Zhotovitel tedy o riziku prokazatelně věděl.

Bylo písemně do deníku uvedeno, že do objektu KCP nesmí v průběhu výstavby zatéct a že zhotovitel je povinen zajistit dostatečnou ochranu. O uvedené události není ve stavebním deníku proveden zápis zhotovitele, ačkoli jej zhotovitel byl povinen provést obratem po vzniku události. Vedení stavebního deníku je povinností zhotovitele dle § 166 zák. č. 283/2021 Sb., obsahové náležitosti stanoví příloha č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

Byl nutný zásah jednotky HZSP KCP — náklady zásahu budou vyúčtovány zhotoviteli.

Rozsah škod na majetku, stavebních konstrukcích a technologickém zařízení (zejména technologie DUN) bude ověřen objednatelem; nárok na náhradu škody se tímto vyhrazuje v plném rozsahu.

PŘÍLOHY




WhatsApp Video
202...05.52.mp4




KCP - Stavební den...08-
24.pdf

WhatsApp Image 202...2 (1).jpg

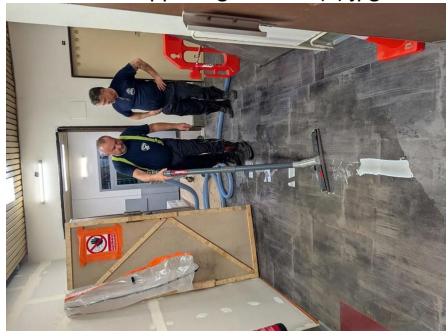


WhatsApp Image 202...05.49.jpg

WhatsApp Image 202...2 (2).jpg

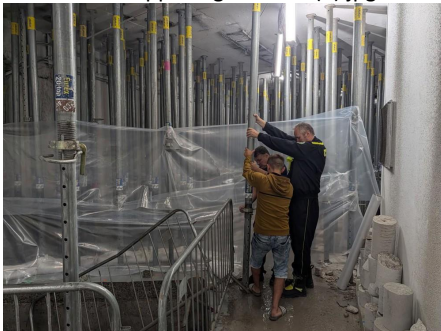

WhatsApp Image 202...7 (2).jpg

WhatsApp Image 202...05.52.jpg

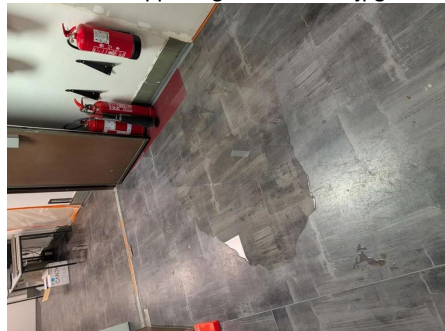

WhatsApp Image 202...7 (1).jpg



WhatsApp Image 202...08.57.jpg



CHMU_Karlovy_260825.jpg



Denní data									
Datum	Prostřední denní teplota		Min. denní		Max. denní		Prostřední denní teplota		Prostřední denní teplota
	odpolední	noční	odpolední	noční	odpolední	noční	odpolední	noční	
22.8.2025	25.5 °C	18.5 °C	22.5 °C	15.5 °C	28.5 °C	21.5 °C	25.5 °C	18.5 °C	25.5 °C
23.8.2025	25.5 °C	18.5 °C	22.5 °C	15.5 °C	28.5 °C	21.5 °C	25.5 °C	18.5 °C	25.5 °C
24.8.2025	25.5 °C	18.5 °C	22.5 °C	15.5 °C	28.5 °C	21.5 °C	25.5 °C	18.5 °C	25.5 °C
25.8.2025	25.5 °C	18.5 °C	22.5 °C	15.5 °C	28.5 °C	21.5 °C	25.5 °C	18.5 °C	25.5 °C
26.8.2025	25.5 °C	18.5 °C	22.5 °C	15.5 °C	28.5 °C	21.5 °C	25.5 °C	18.5 °C	25.5 °C
27.8.2025	25.5 °C	18.5 °C	22.5 °C	15.5 °C	28.5 °C	21.5 °C	25.5 °C	18.5 °C	25.5 °C
28.8.2025	25.5 °C	18.5 °C	22.5 °C	15.5 °C	28.5 °C	21.5 °C	25.5 °C	18.5 °C	25.5 °C
29.8.2025	25.5 °C	18.5 °C	22.5 °C	15.5 °C	28.5 °C	21.5 °C	25.5 °C	18.5 °C	25.5 °C
30.8.2025	25.5 °C	18.5 °C	22.5 °C	15.5 °C	28.5 °C	21.5 °C	25.5 °C	18.5 °C	25.5 °C
