



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	7,4°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	207°	100%
12:00	Polojasno	14,8°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	283°	81%
18:00	Polojasno	18,9°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	163°	54%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
GEMO a.s.	2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:


POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Kontrola staveniště - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Slovák Daniel (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	JE Group s.r.o.
Zastavuji práce na provádění řezání stropní desky v 1.PP mezi osami 6-9 a B-D, a to z důvodů nezajištění pracovníka, obsluhující řezací soupravu kolektivní/osobní ochranou proti pádu, a to do odstranění tohoto nedostatku, ohrožující zdraví a bezpečnost pracovníka/pracovníků (porušení NV č.362/2005 Sb., §3). Zároveň žádám o okamžité zajištění otvorů na parteru 1.NP mezi osami proti pádu osob (viz foto).			
PŘÍLOHY			

KCP - Stavební den...10-05.pdf

nezajištění zábran... 1.PP.jpg

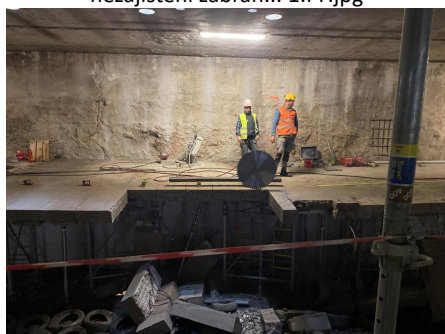

odkryté otvory 1.jpg



odkryté otvory 2.jpg




AUTOR	Římal Aleš (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	GEMO a.s.
Reakce na zápis Slovák Daniel (TDS), ze dne 5.10.2026: Pracovníci byli opětovně proškoleni a byli doplněny prostředky pro osobní ochranu proti pádu. (foto zašleme p. Figrovi) Nyní se práce na řezání prohnutého stropu neprovádí z důvodu opravy havárie vody mimo stavbu. Davové oplocení bylo vráceno na původní pozice, aby bylo zajištěno oplocení po obvodu vybouraných děr. Toto oplocení se bude každodenně kontrolovat. Pracovníci byli upozorněni na povinnost vracet oplocení zpět do původního stavu.			
PŘÍLOHY			

KCP - Stavební den...10-05.pdf

20261005_130737.jpg

20261005_151150.jpg

20261005_151157.jpg

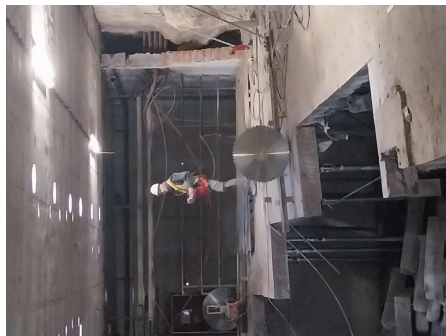

AUTOR

Římal Aleš (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

GEMO a.s.

Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 4.10. - 9.10.2026

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...10-
05.pdf

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.10.13
12:28:39
+02'00'

Ing. Daniel
Slovák
