



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	14,5°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	27°	85%
12:00	Polojasno	19,3°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	80°	65%
18:00	Jasno	21,0°C	0,0 mm/h	4,3 m/s	56°	58%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Bourání cihelné stěny el. rozvodny pod Velínem - Vrtání stropní desky 2.PP a 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 2.PP dle odsouhlasení statika - Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací - Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP - Stojkování 2PP Rondel - Přípravné práce pro vrtnou plošinu - Provádění opatření proti zatečení do velínu - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Provádění pilot: 35b	Hinton a.s		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
Slovák Daniel (TDS)	JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Římal Aleš (Stavbyvedoucí), ze dne 25.8.2026:
Bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot (zrealizovaných armokošů):
Koš A1 2x, A2 1x, C1 1x, C2 1x a P1 5x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Před vlastním osazením do piloty je nutné vždy upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-26.pdf


IMG_5807.jpg



IMG_5808.jpg



IMG_5809.jpg

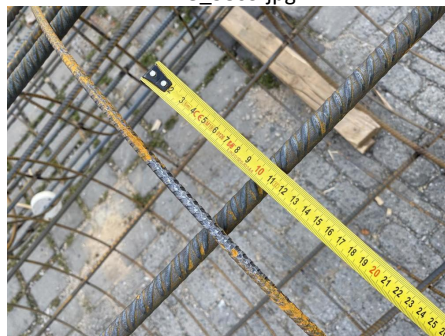

IMG_5810.jpg



Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.01
08:46:33
+02'00'
