



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	8,9°C	0,0 mm/h	0,3 m/s	0°	85%
12:00	Zamračeno	17,1°C	0,0 mm/h	2,8 m/s	181°	56%
18:00	Déšť	15,4°C	0,8 mm/h	8,1 m/s	280°	81%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
GEMO a.s.	2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Kontrola staveniště - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Smejkal Marek (Pracovník technické kontroly)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.


Upozorňujeme tímto GD a žádáme o vysvětlení proč byl použit pro betonáž patky beton expoziční třídy XC3 (viz dodací list) místo XC4 (viz projektová dokumentace) .

Marek Smejkal , Dalibor Zikeš

PŘÍLOHY

DD_0101_SK_501_01-
...patek.pdf

9.jpg

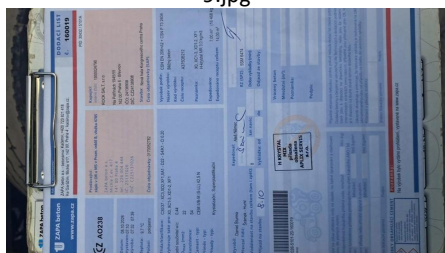

AUTOR Chytil Radim (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Reakce na zápis Smejkal Marek (Pracovník technické kontroly), ze dne 8.10.2026:

Dle požadavků statika byl upraven max. sloupec průsaku 50mm. Třída betonu C30/37 zůstala beze změny a došlo pouze k úpravě stupňů vlivů prostředí – viz změna/potvrzení („postačí XA1“). Emailová korespondence se statikem zaslána dnes.

Se změnou hodnoty max. průsaku a současně potvrzením chemicky agresivním prostředím XA1 došlo i k úpravě stupně vlivu XC (karbonatace) dle interních systémů dodavatele ZAPA beton a.s.

Betonová směs splňuje pro danou recepturu vodní součinitel w/c dle ČSN EN 206 pro stupeň vlivu XC4

V příloze zasílám oficiální vyjádření technologa Zapa.

Dále jsem o této situaci informoval p. Morkse, který sepiše stanovisko a pokynem stavby vydá aktualizovanou legendu betonů.

PŘÍLOHY



Vyjádření ROCK
SAL...tředí.pdf

AUTOR

Římal Aleš (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 4.10. - 9.10.26.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...10-
08.pdf

AUTOR

Chytil Radim (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Žádám o kontrolu armování patky v osách J/3 + kontrola bednění (distancí)
