STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	13,5°C	0,0 mm/h	3,5 m/s	253°	88%
12:00	Zamračeno	19,6°C	0,1 mm/h	4,2 m/s	264°	49%
18:00	Déšt	15,1°C	0,6 mm/h	2,8 m/s	191°	92%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8
						Hinton a.s	4	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Demontáž kabelů 2PP, 1PP	Gemo 204 elektro		
- Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika - Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací - Bourání cihelné stěny v části DUN - Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP - vrtání a řezání otvoru 1PP, 2 PP, 3PP rondel - vytažení betonových dílců 1PP, 2PP, 3PP	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Provádění protizátokových opatření v místnostech velína (hrázky 1 NP) - Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP ,3PP - Demontáž TZB parking 2PP, 1PP - Stojkování 1PP 2PP Velín - Zakrývání stěrek u prostor velína 1 PP a 2 PP . - Příprava pro betonáž pod panely VJ1,2	GEMO a.s.		
- návoz příslušenství pro vrtnou soupravu	Hinton a.s		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Matějíček Jiří (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Zhotovitel nepostupuje dle předaného zápisu o předání plochy pro vrtnou soupravu č. 1 ze dne 17.8.2026. Vymezený prostor pro pojezd vrtné plošiny musí být po celou dobu stavby vymezen jak barevně na zemi, tak pomocí mobilního oplocení včetně výstražné pásky, jak je aplikováno. Dle fotografie v příloze není předaný prostor ohraničen mobilním oplocením, ani výstražnou páskou!!!

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...08-18.pdf

KCP_260818.jpg IMG_20260817_142900.jpg



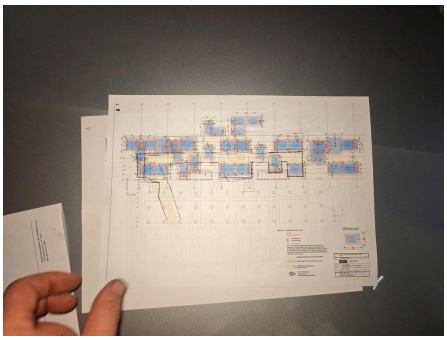

Podpisy:

Radim Chytil

Podepsal Radim Chytil
Datum: 2026.08.21 09:03:08 +02'00'
